Itä-Suomen Controlteam Oy

Päällikkö: **Suunnittelija: olli.tirkkonen**
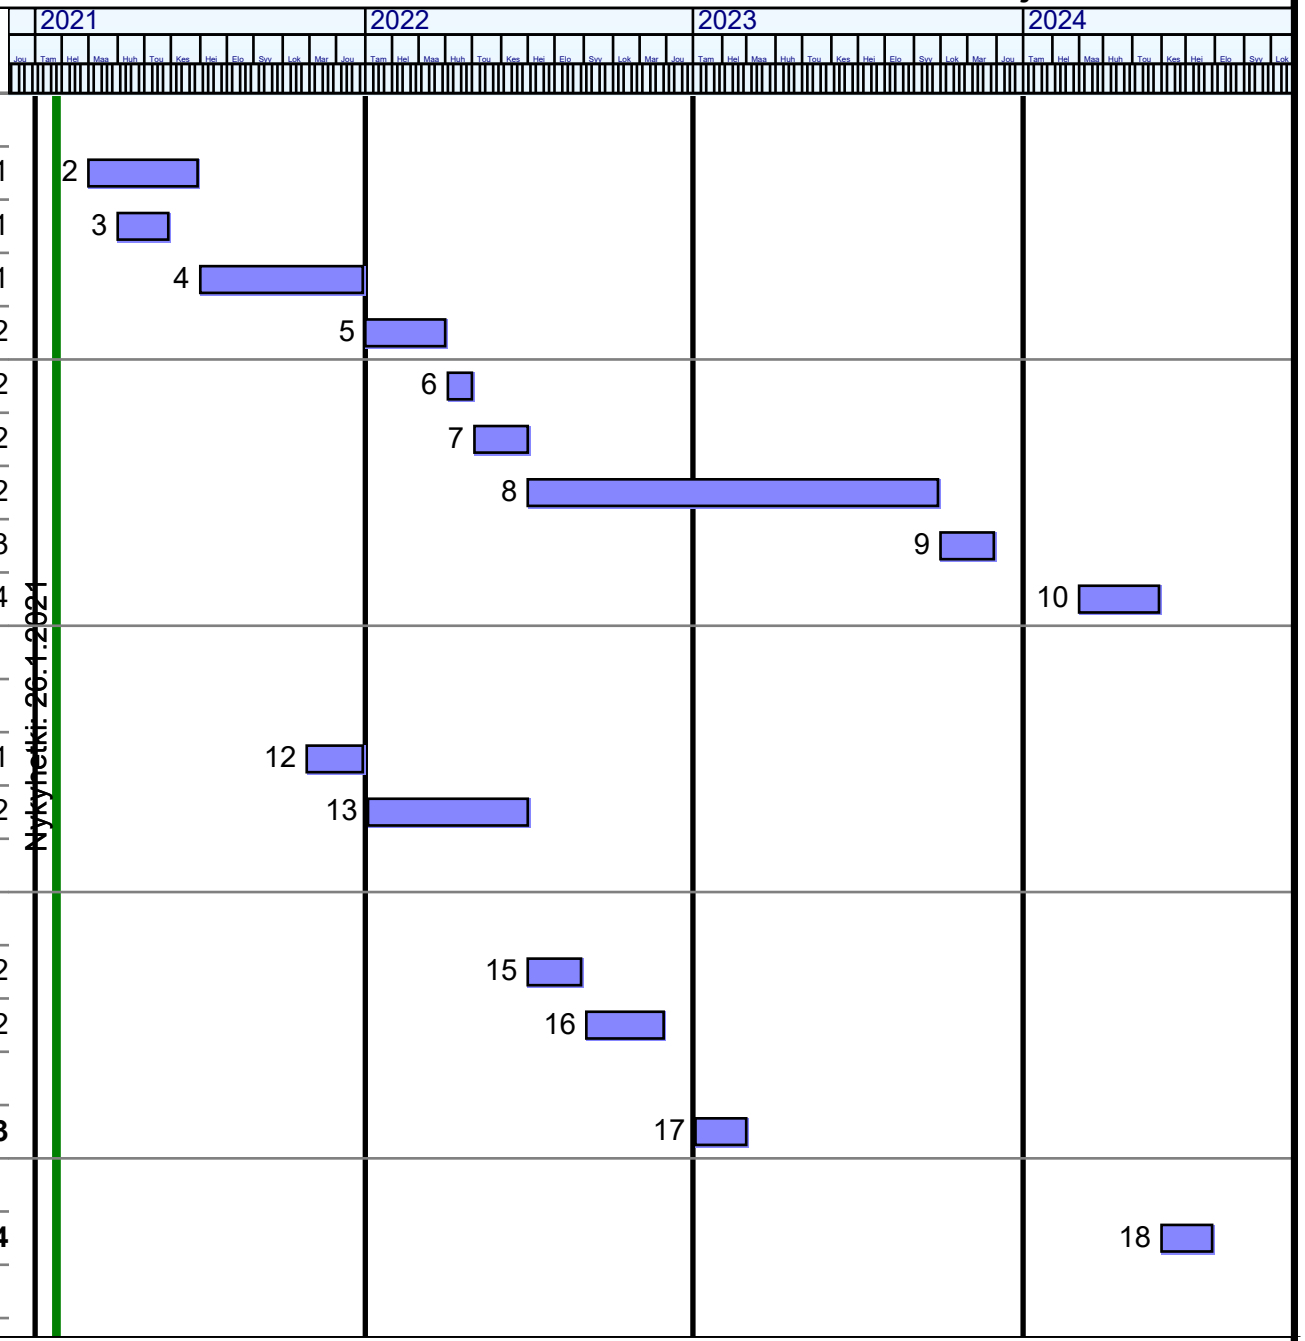
Hierarkia	Selite	Kesto	Alkaa
1	**VE 1 UUDIS**		
2	Ehdotussuunnittelu	88 pv	1.3.2021
3	Toteutussuunnittelun kilpailutu	41 pv	2.4.2021
4	Toteutussuunnittelu	132 pv	1.7.2021
5	Poikkeamisluvan käsittely	65 pv	3.1.2022
6	Urakkakilpailu	22 pv	4.4.2022
7	Päätöksenteko ja valitusaika	44 pv	3.5.2022
8	Rakentaminen	326 pv	1.7.2022
9	Purku Kirjasto-Ruokala	44 pv	2.10.2023
10	Piha-alueet ja infra	64 pv	5.3.2024
11	**VE1 TELETALO**		
12	Suunnittelu	46 pv	29.10.2021
13	Rakentaminen	129 pv	4.1.2022
14	**VE1 KALLIORINNE**		
15	Suunnittelu	45 pv	30.6.2022
16	Rakentaminen	65 pv	2.9.2022
17	**VE1 JAKELUKEITTIÖ TK**	**42 pv**	**3.1.2023**
18	**VE1 YHTENÄISKOULU/NUO**	**43 pv**	**3.6.2024**
